Renovationsplan 2026, Finale 2.0
Stand: 24.03.2026

Nr.	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende
1	Renovationsplan 2026	150 Tage	Mon 23.03.26	Fre 23.10.26
2	Ferien	150 Tage	Mon 23.03.26	Fre 23.10.26
3	Osterferien 2026	10 Tage	Mon 23.03.26	Die 07.04.26
4	Sommerferien 2026	30 Tage	Don 02.07.26	Mit 12.08.26
5	Herbstferien 2026	10 Tage	Mon 12.10.26	Fre 23.10.26
6	Renovation Baubetriebshof	118 Tage	Mon 11.05.26	Fre 23.10.26
7	Jahnsportplatz	6 Tage	Mon 01.06.26	Don 16.07.26
8	Jahnsportwoche	6 Tage	Fre 17.07.26	Fre 24.07.26
9	Platz Ihlpohl B	6 Tage	Mon 11.05.26	Fre 03.07.26
10	ASV-Ihlpohl (D-Turnier)	2 Tage	Fre 19.06.26	Mon 22.06.26
11	Platz Ihlpohl A	6 Tage	Mon 22.06.26	Fre 14.08.26
12	Platz Lesemstotel (Herrenturnier)	2 Tage	Fre 26.06.26	Mon 29.06.26
13	Platz Lesemstotel	6 Tage	Mon 29.06.26	Fre 21.08.26
14	Platjenwerbe, Schnuppertag	2 Tage	Don 06.08.26	Fre 07.08.26
15	Platz Platjenwerbe	6 Tage	Mon 15.06.26	Mit 05.08.26
16	Variable Fläche A + B	6 Tage	Mon 22.06.26	Fre 14.08.26
17	Riessportplatz	6 Tage	Mon 24.08.26	Fre 16.10.26
18	Platz B	6 Tage	Mon 31.08.26	Fre 23.10.26

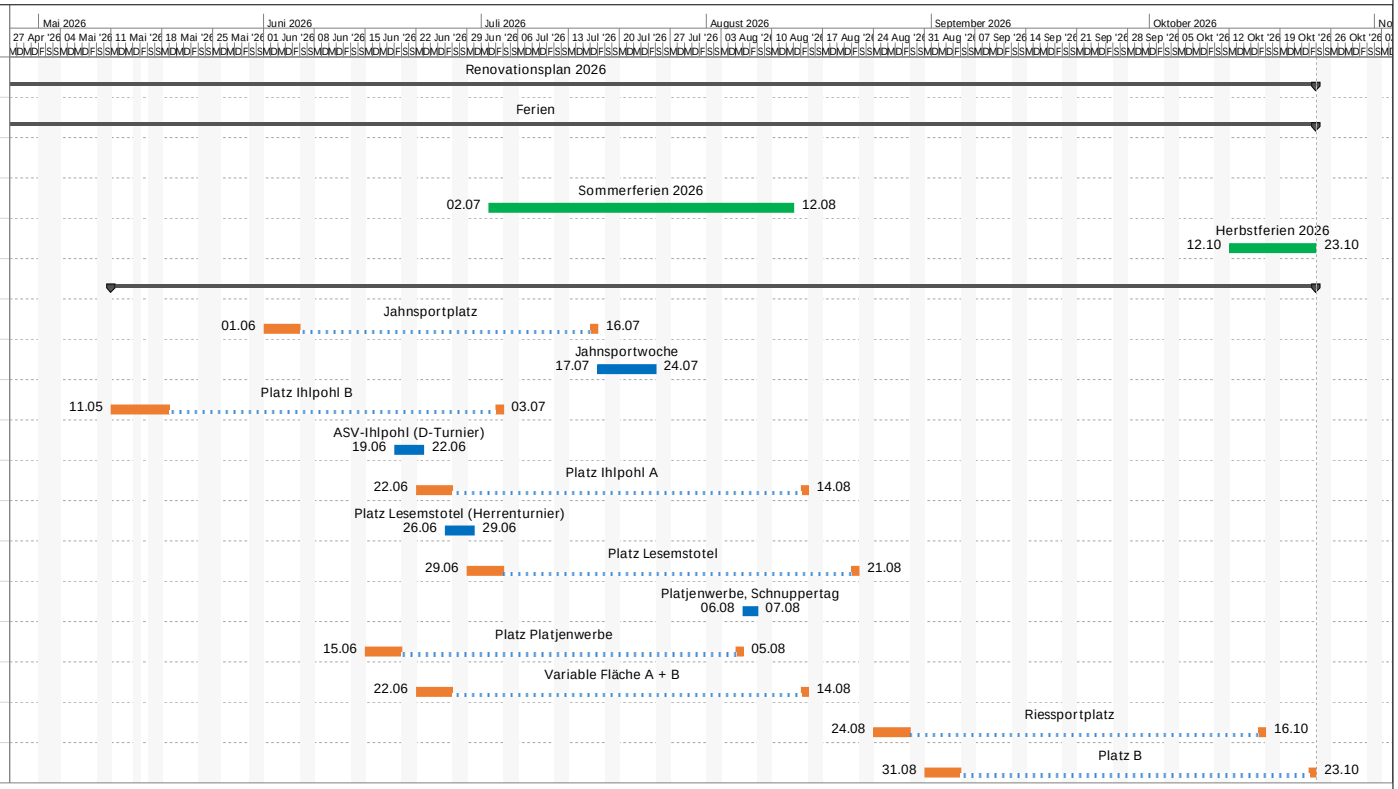

Projekt: Renovationsplan_2026
Datum: Mon 23.03.26

Vorgang | Sammelvorgang | Inaktiver Meilenstein | Nur Dauer | Nur Anfang | Externer Meilenstein | Manueller Fortschritt
Unterbrechung | Projektsammelvorgang | Inaktiver Sammelvorgang | Manueller Sammelrollup | Nur Ende | Stichtag
Meilenstein | Inaktiver Vorgang | Manueller Vorgang | Manueller Sammelvorgang | Externe Vorgänge | In Arbeit
